1863-02-04

AFSENDER
J. C. Jacobsen

MODTAGER
Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
CA 000031959/0000007643

Emneord:
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi

DOKUMENTINDHOLD

Ansøgning fra J. C. Jacobsen om tilladelse til at opføre nye bygninger på Carlsberg samt bygningsinspektoratets positive svar

TRANSSKRIPTION

Carlsberg 4 Februar 1863.

Anmeldelse
Til Bygningsinspectionen i Frederiksberg Sogn.

Undertegnede agter at foretage følgende Bygningsforandringer ved den af mig tilhørende Eiendom Carlsberg i Valby:

A. Efter Tegningen N°. 1. I Malthusets Stue-Etage indrettes i 3 af Værelserne forskjellige Aflukker til Fadebur, Buffet og Garderobe og 2 nye Kakkelovne opsættes i Forbindelse med ældre Skorstensrør. Desuden agtes opsat en Kogeindretning af Jern hvorfra Røgen afledes i et Jernrør til Bryggeriets Hovedskorsten. Udover Røgrøret anbringes et Em-Rør ligeledes af Jern. Over Kogeindretningen anbringes en Kappe af Jern.

B. Efter Tegningen N°. 2. Den vestre Ende af den ældste Lagerbygning forandres saaledes, at Ydermuren af Bindingsværk ombygges af Grundmuur (dog foreløbig kun i underste Etage) og en Skorsten opføres. Skillerummene forandres og opføres dels af Grundmuur, dels af Planker med Muurpuds. Loftet forskalles og gibses i Værelserne.

C. Desuden indrettes i den nordre, grundmurede Lagerbygning et Materialskur hvis Konstruction nærmere vil blive bestemt efter Konference med Bygningsinspecteuren.Arbeidet agtes paabegyndt saasnart Approbation paa Planerne er modtaget.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen
Brygger

Verte

Ifølge omstaaende Anmeldelse meddeles herved Approbation til Udførelsen af:

Bygningsforandringer i Malthusets Stueetage efter Tegningen N°. 1, under Betingelse af, at Kogeindretningen konstrueres friitstaaende, paa Been af Jern, med dens Underplade hævet mindst 6 Tommer over Bredegulvet, hvorpaa den staar, og at Gulvet under Kogeindretningen og omkring den i 18 Tommers Afstand fra den dækkes med uantændelige Materialer; og Bygningsforandringen af den vestre Ende af Lagebygningen, efter Tegningen N°. 2, under Betingelse af at denne Deel af Bygningen – saafremt Værelserne agtes afbenyttede til Beboelse - i dens hele Høide ombygges af Grundmuur, og at der i Bjælkelagene anbringes en Flade Bræder, der belægges med et 2 Tommer tykt Leerlag. For de foranførte Arbeider bliver Byggelovens Forskrifter i øvrigt nøie at iagttage ved Udførelsen --
Hvad derimod angaar Indrettelsen af Materialskuret i den nordre Lagerbygning, da skal jeg – saafremt Skillerummene agtes opførte af enkelte Br.. uden udvendig Kalkpuds - tjenstligst bede mig meddelt en særskildt Begjæring desangaaende, til at forelægge Bygningskomissionen til Erklæring.-
Frederiksberg og Hvidovre Bygningsinspektorat d. 6 Februar 1863.

M. P. H. Wolff

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

Carlsberg 4 Februar 1863.

Anmeldelse
til Byggeinspectionen i Frederiksberg Sogn.

Undertegnede agter at foretage følgende Byggeinspectionen forandringer ved den mig tilhørende Eiendom Carlsberg i Valby:

A. Efter Tegningen No. 1. I Matthæsets Stue-Etage indrettes i 3 af Vaarelserne forskjellige Aflukker til Fadebuur, Buffet og Garderobe og 2 nye Lakkelarne opsattes i Forbindelse med aldre Korsteensrør. Desuden agtes opsat en Tageindretning af Jern, hvorfra Rågen afledes i et Jernrør til Byggeriets Hovedkorsteen. Udenom Rågrøret anbringes et Em-Rør ligeledes af Jern. Over Tageindretningen anbringes en Tappe af Jern.

B. Efter Tegningen No. 2. Den vestre Ende af den aldste Lagerbygning forandres saaledes, at Ydermurene af Bindingsværk ombygges af Grundmuur (dog foreløbig kun i underste Etage) og en Korsteen opføres. Killermurene forandres og opføres deels af Grundmuur, deels af Planker med Muurpuds. Loftet forskales og gibses i Vaarelserne.

C. Desuden indrettes i den nordre, grundmurede Lagerbygning et Materialskuur, hvis Construction normeres vil blive bestemt efter Conferenze med Byggeinspectionen. Arbeidet agtes paabegyndt saasnart Approbation paa Planerne er modtaget.

Arbeidigst
J. C. Jacobsen
Bygger.

verte

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

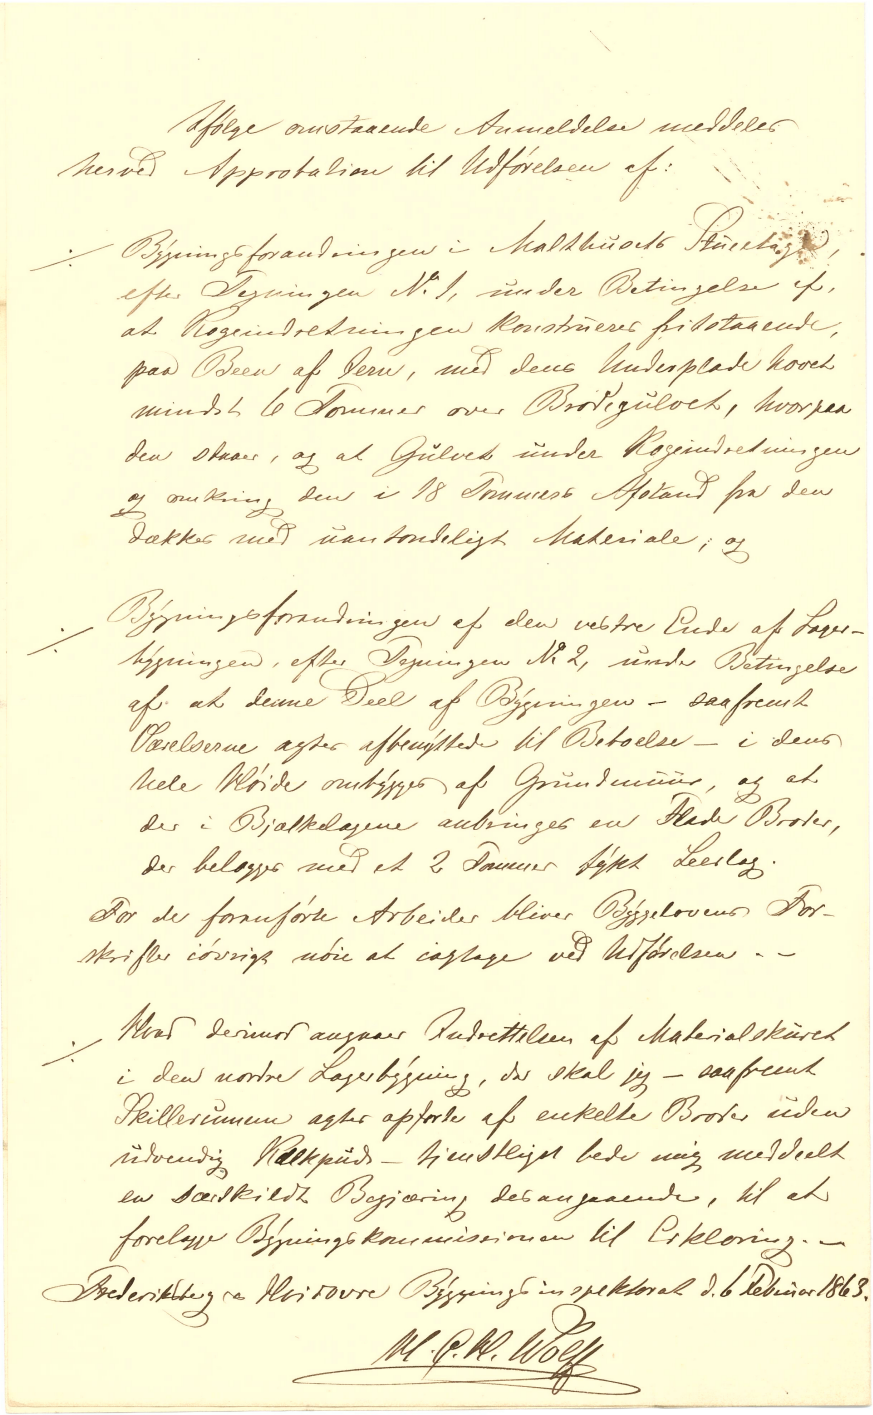

Ifølge omstaaende Anmeldelse meddeles herved Approbation til Udførelsen af:

/: Bygningsforandringen i Malthusets Stuetage, efter Tegningen No. 1, under Betingelse af, at Kogeindretningen konstrueres fritstaaende, paa Been af Jern, med dens Underplade hovet mindst 6 Tommer over Brødgulvet, hvorpaa den staaer, og at Gulvet under Kogeindretningen og omkring den i 18 Tommers Afstand fra den dækkes med uantondeligt Materiale; og

/: Bygningsforandringen af den vestre Ende af Lagerbygningen, efter Tegningen No. 2, under Betingelse af at denne Deel af Bygningen – saafremt Værelserne agtes afbenyttede til Beboelse – i dens hele Høide omtygges af Grundmuur, og at der i Bjælkelagene anbringes en Flade Broder, der belagges med et 2 Tommer tykt Leerlag.

For de foranførte Arbeider bliver Bygglovens Forskrifter iøvrigt nøie at iagtage ved Udførelsen. –

/: Hvad derimod angaaer Indrettelsen af Materialskuret i den nordre Lagerbygning, der skal jeg – saafremt Skillerummen agtes opførte af enkelte Broder uden udvendig Kalkpuds – tjenstligst bede mig meddeelt en særskildt Begjæring desangaaende, til at forelægge Bygningskommissionen til Erkloring. –

Frederiksberg og Hvidovre Bygningsinspektorat d. 6 Februar 1863.

M. C. H. Wolff
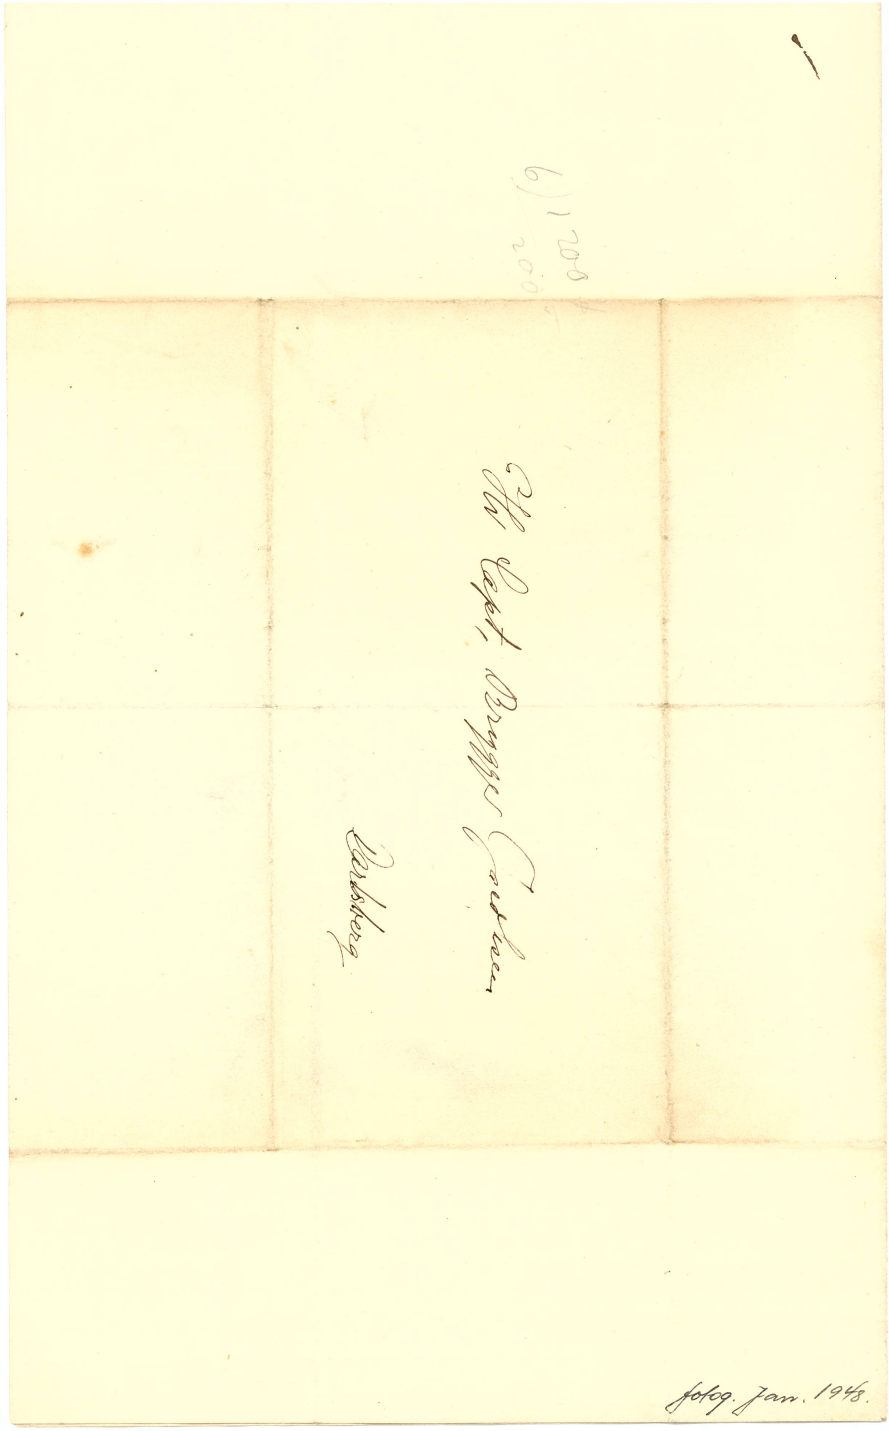
J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET
